



Kadeverbetering Steendam-Tjuchem bijna gereed

6 | Juli 2023

De kade van het afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem is versterkt. Het fietspad en de wegen kunnen weer worden gebruikt. Het gebied is weer toegankelijk en de kade veilig voor de toekomst.

De laatste loodjes

Eind mei was de grondkade op orde en is het grootste gedeelte van de wegen en het fietspad geasfalteerd. Tussendoor hebben we vervolgens het traject Steendam, waar de weg op de kade ligt, geasfalteerd. Tot slot is de ontsluitingsweg aan de Tjuchem kant van de bovenste laag asfalt voorzien. Direct daarna gaven we de weg weer vrij voor gebruik.

Ondertussen hebben we de bermen en andere locaties afgewerkt. De betonnen landbouwontsluitingsweg is klaar. We moeten nog enkele afrondende werkzaamheden uitvoeren.

Na de officiële oplevering heeft Arcadis nog een onderhoudstermijn van 1 jaar. Dit betekent dat Arcadis in deze periode verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kade, de wegen en de bermen binnen het projectgebied.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
Henk Hazelhorst van Arcadis via
steendam-tjuchem@arcadis.com of 06 27060276



Terugblik


Ondanks enkele forse tegenslagen is het nagenoeg gelukt om volgens oorspronkelijke planning te eindigen. We hadden onder andere te maken met de volgende tegenslagen:

- Een vertraging van enkele maanden in de aanleg van een nieuwe hoofdtransportleiding door waterbedrijf Groningen, waardoor onze werkzaamheden bij de Kooilaan ook enkele maanden stagneerden.
- Als gevolg daarvan konden wij pas laat starten met het aanbrengen van de voorbelasting bij de kruising Kooilaan. Daardoor duurde de periode waarin de ondergrond moest zetten op de plek langer.

- Plaatselijk bleek er nabij Steendam een langzamere zetting van de ondergrond op te treden dan vooraf verwacht. Kade, fietspad en toegangsweg konden daardoor pas later worden geasfalteerd.
- Op twee plaatsen troffen we onverwacht verontreiniging aan, die deels verwijderd moest worden.

Passende afsluiting met direct aanwonenden

Voor direct aanwonenden en betrokkenen organiseren we een gezellig samenzijn op 15 september. Zij ontvangen hiervoor een afzonderlijke uitnodiging.

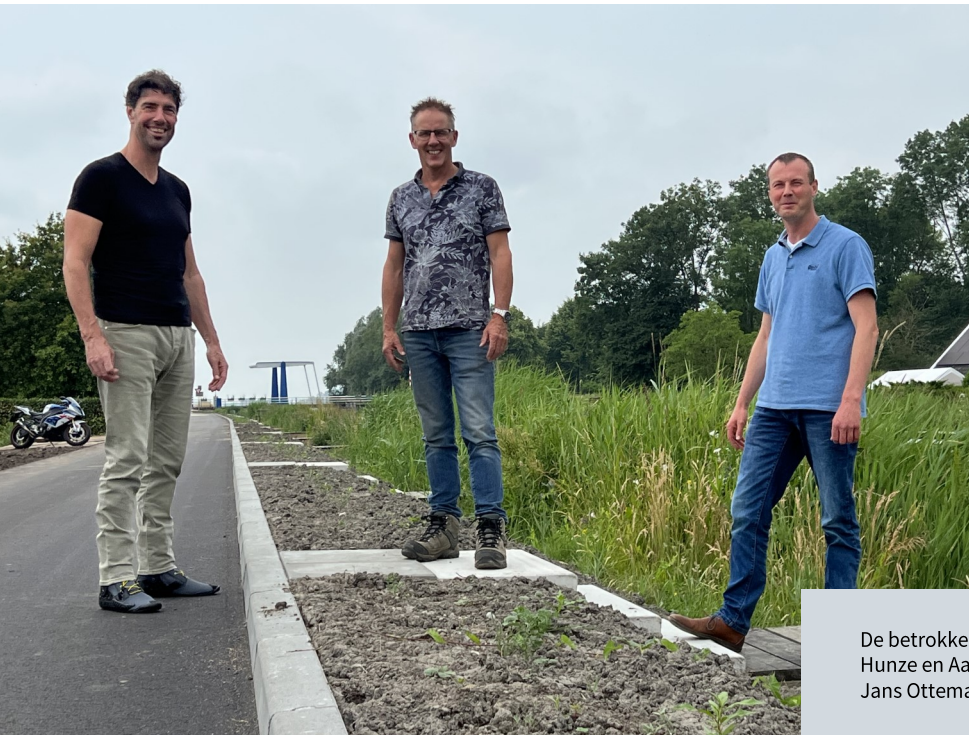

De betrokken projectleiders v.l.n.r. Alexander Kars (waterschap Hunze en Aa's), de uitvoerder van Arcadis Willem Sikkema en Jans Ottema (Arcadis)

Omwonenden werkten heel goed mee

Zo'n twee jaar is er gewerkt aan dit project. Omwonenden hebben dus twee jaar tussen de werkzaamheden gewoond. Inmiddels zijn de wegen vrijgegeven. Hoe is het werk gegaan?

Jans Ottema (Arcadis) en Alexander Kars (waterschap Hunze en Aa's) zijn daarover duidelijk. Het was een langlopend, maar mooi project, zonder echte obstakels. Natuurlijk was er wel eens wat, maar alles is redelijk gemoedelijk en in goed overleg geregeld. Willem Sikkema (Arcadis) beaamt dit. Hij heeft als uitvoerder op het werkgebied het meeste contact met omwonenden. "Iedereen heeft heel goed meegewerkt."

Alexander: "Doordat we het fietspad konden stremmen konden we gewoon ons werk doen. Dat is voor de omgeving vervelend, maar het werk kan wel gewoon door."

Jans: "Door gebruik te maken van de toekomstige toegangsweg naar het zonnepark en het weiland konden we overlast voor de inwoners van het Damsterdiep en langs het kanaal beperken. Bovendien konden we de brug in Steendam ontlasten." Alexander: "En de dijk natuurlijk, want daar willen we in verband met veiligheid ook niet met zwaar materieel over."

Willem: "We hebben overlast redelijk kunnen beperken. Natuurlijk is in elk project wel wat, maar daar probeer je dan direct met de mensen uit te komen. We moesten over en in tuinen aan het werk. Zo zijn we bijvoorbeeld nog met de opritten bezig. Goed overleg en duidelijke afspraken maken over hoe je het gaat doen is dan heel belangrijk."

Jans: "We zijn nog niet helemaal klaar, maar de bereidheid in de omgeving was groot. We hebben vooraf gezegd dat het lang zou duren – de dijk en de weg moesten eerst 'zetten' voor we het konden afwerken - dus aanwonenden wisten dat." Het werk duurt iets langer dan gepland. Dat heeft verschillende redenen. Alexander: "De fasering moest soms welkijks anders. We liepen tegen een aantal zaken aan, de zetting die tegenviel, de grond die niet schoon was, nutsbedrijven die ook in het gebied bezig waren, herstel van aardbevingsschade aan woningen, maar er werd redelijk soepel en snel geschakeld. Dat was wel tekenend voor dit project."

Dat we wel redelijk in de planning zijn gebleven, is mede dankzij Willem. Hij moest soms snel schakelen om de mannen en het materieel in die situaties wel aan het werk te houden. "En de omwonenden hebben daar goed aan meegewerkt."
